



受水槽の新設工事が進んでいます

4月							5月													
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

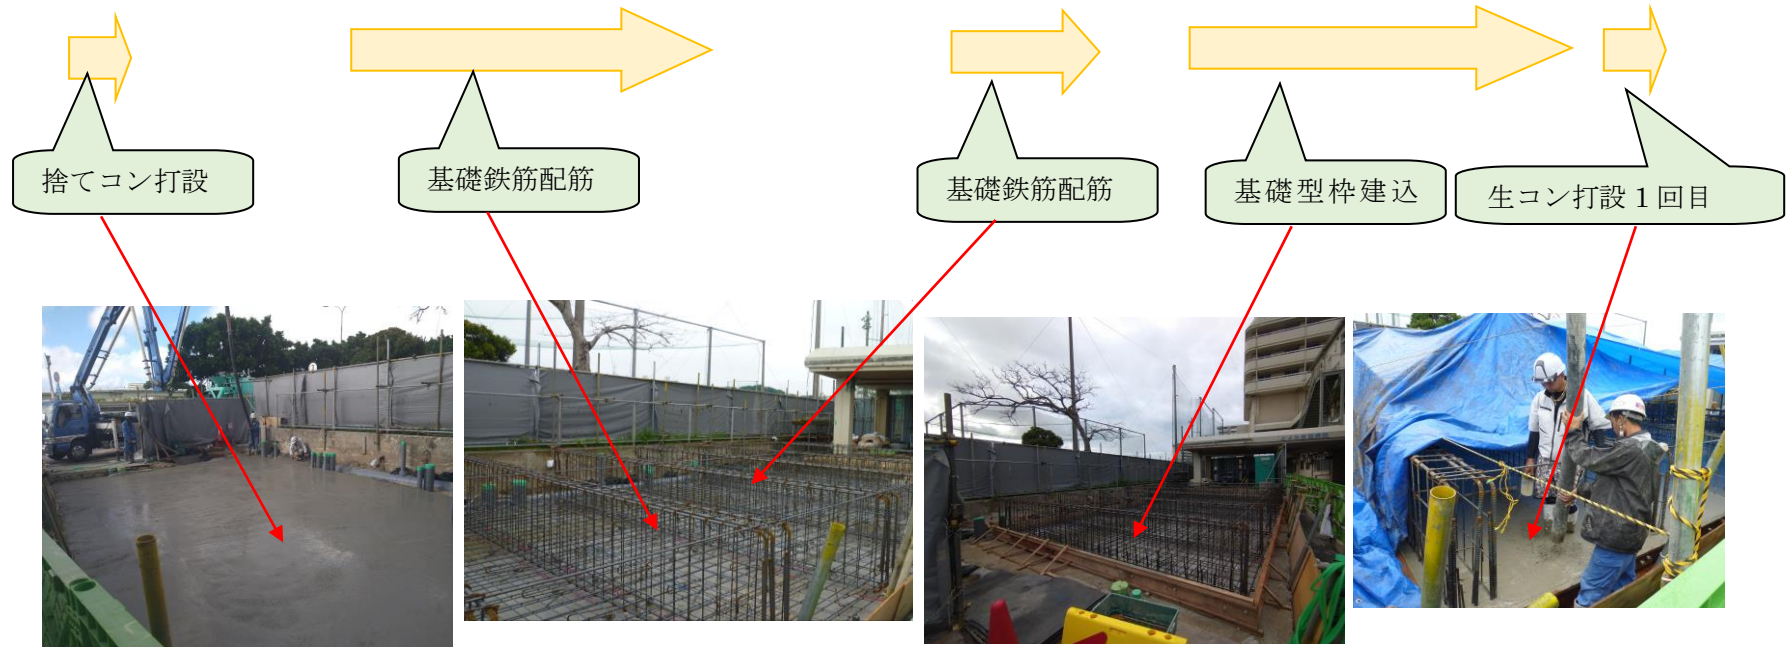

建設用語の解説

捨てコン打設：土を掘り終えた後に打たれるコンクリートのことです。
 基礎鉄筋配筋：基礎の鉄筋を配置して組み立てる作業です。
 基礎型枠建込：基礎のコンクリートを受け止める枠を組み立てる作業です。
 生コン打設：コンクリートを工場から搬んで、流し入れる作業です。



五月十三日(金) 第二回工程会議を開催し左記の項目を確認しました。

- ・前回の議事録確認
- ・四月～五月の月間工程表の確認を行い、月間累計実施出来高にて予定通り作業が行われているのを確認しました。
- ・今後の全体工程表の一部変更の報告を受け、工程期間内での作業日程を進めていくことを確認しました。
- ・五月の中旬より、電気工事において、音の出る作業を行うとの報告を受け、事前に職員へ周知していくことを確認しました。

会議参加者
 発注者（とよみ生協病院）
 設計・監理（東畑建築事務所）
 施工者（東江建設）
 電気設備（きらり電設）
 機械設備（永山組）



第二回工程会議開催しました
